




SZERELÉS

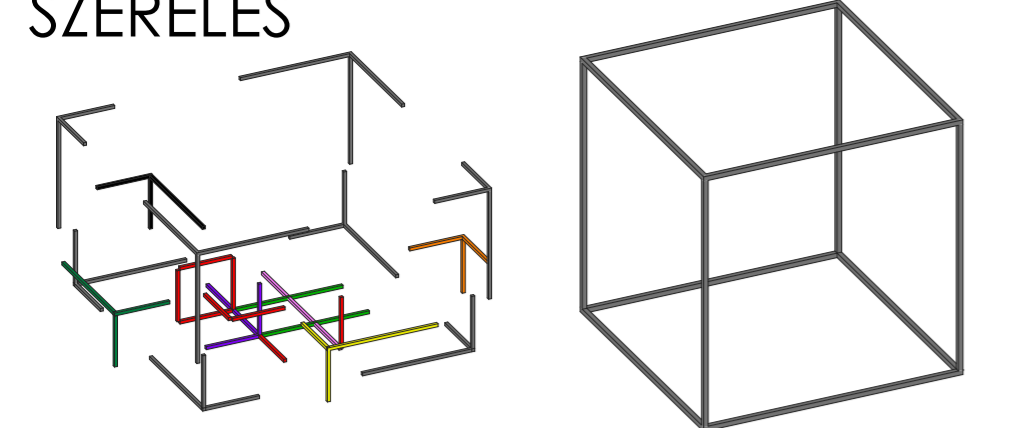


0. AZ ÖSSZESZERELENDŐ ELEMÉK
 1. KERET ÖSSZESZERELÉSE
ELEM IGÉNY: 8 DB (2-1-1), 4 DB (1)

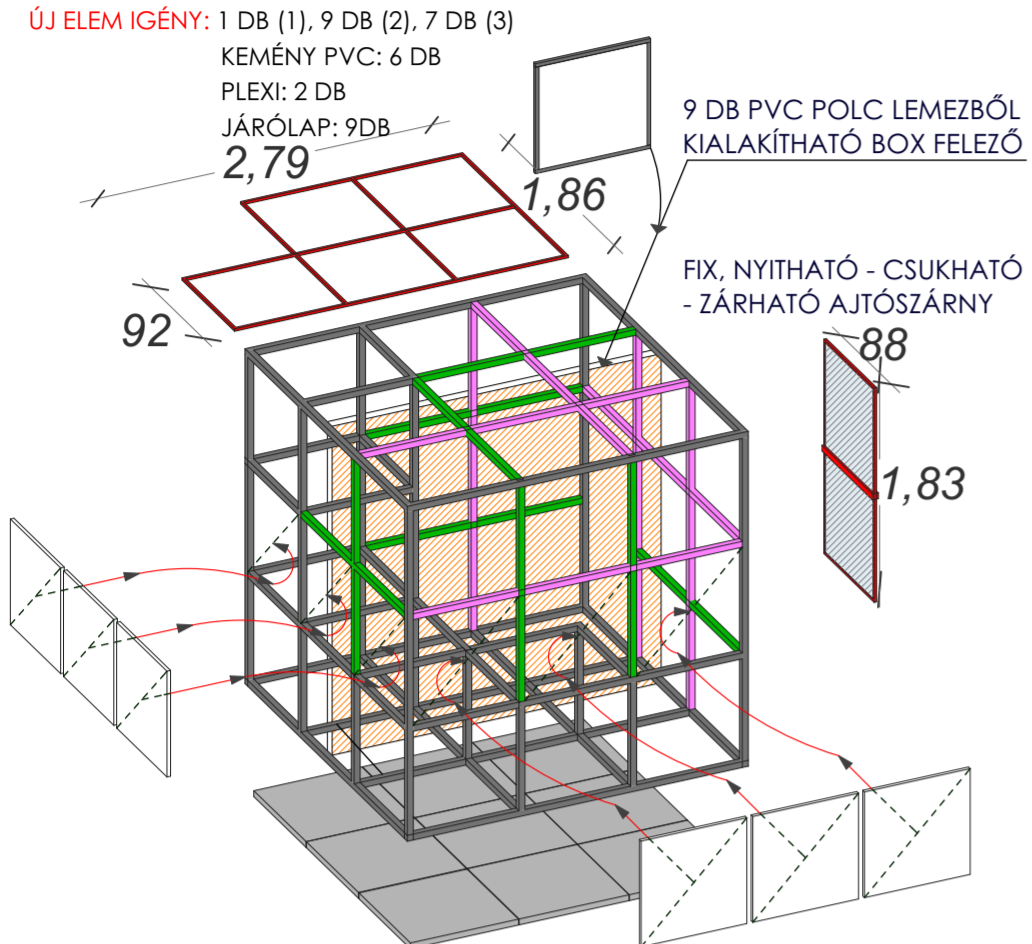


ZÁRÁSNÁL BENTRŐL BEPATINTHATÓ LAPOK
 6. AZ OLDALLAPOK ÉS TETŐ ZÁRTSZELVÉNYEINEK RÖGZÍTÉSE

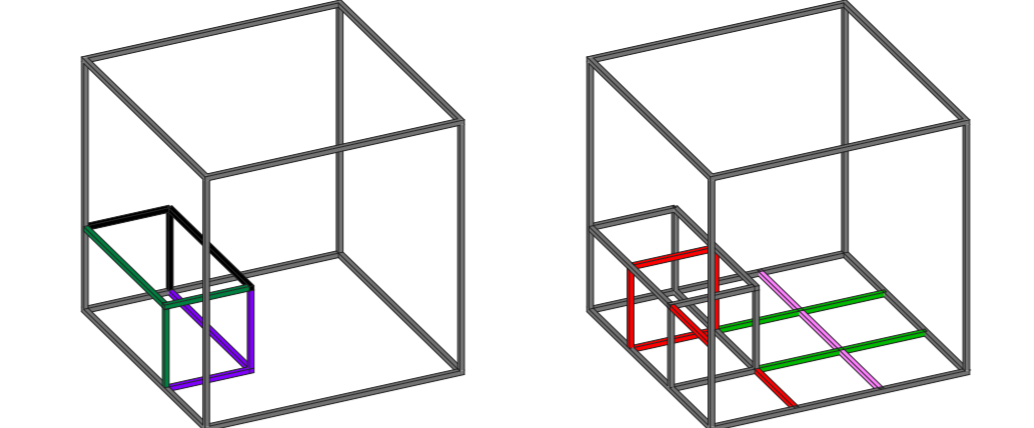


2. SAROK MEREVÍTÉSE
ÚJ ELEM IGÉNY: 3 DB (2-1-1)
 3. JÁRÓFELÜLET - POLC VÁZ SZERELÉSE
ÚJ ELEM IGÉNY: 6 DB (1), 2 DB (2), 1 DB (3)

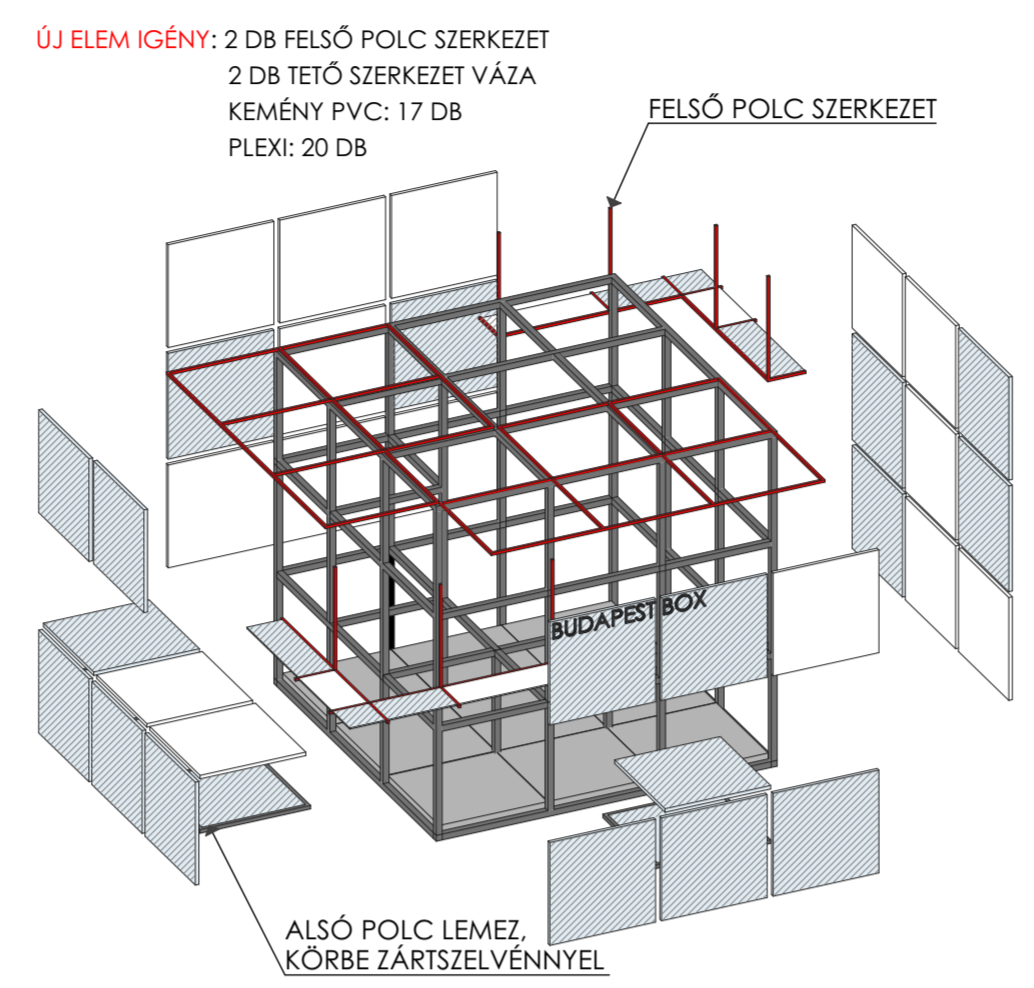

7. AZ OLDALLAPOK ÉS TETŐ MODULJAINAK BELSŐ OLDALI BEPATINTÁSA

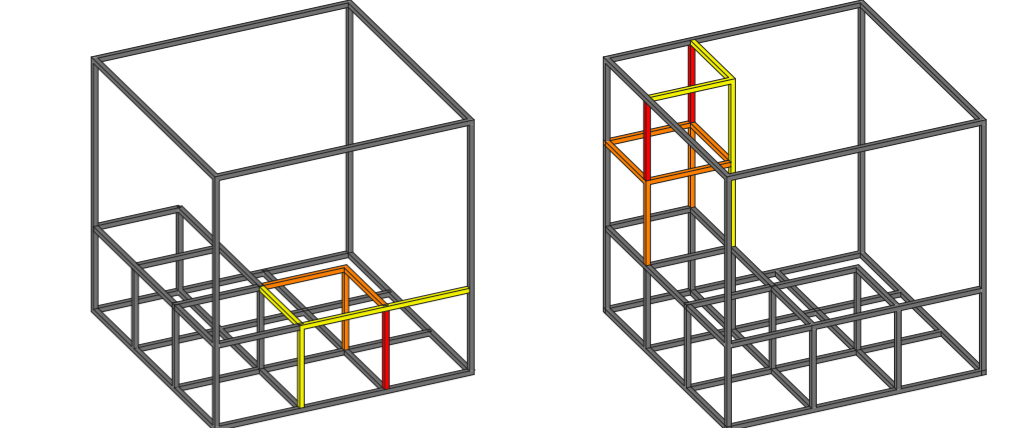


4. POLC VÁZAK TOVÁBBI RÖGZÍTÉSE
ÚJ ELEM IGÉNY: 1 DB (2-1-1), 1 DB (1-1-1), 1 DB (1)
ÚJ ELEM IGÉNY: KEMÉNY PVC: 6 DB
 PLEXI: 9 DB
 5. FÜGGŐLEGES SAROKMEREVÍTÉS
ÚJ ELEM IGÉNY: 1 DB (2-1-1), 2 DB (1-1-1), 2 DB (1)

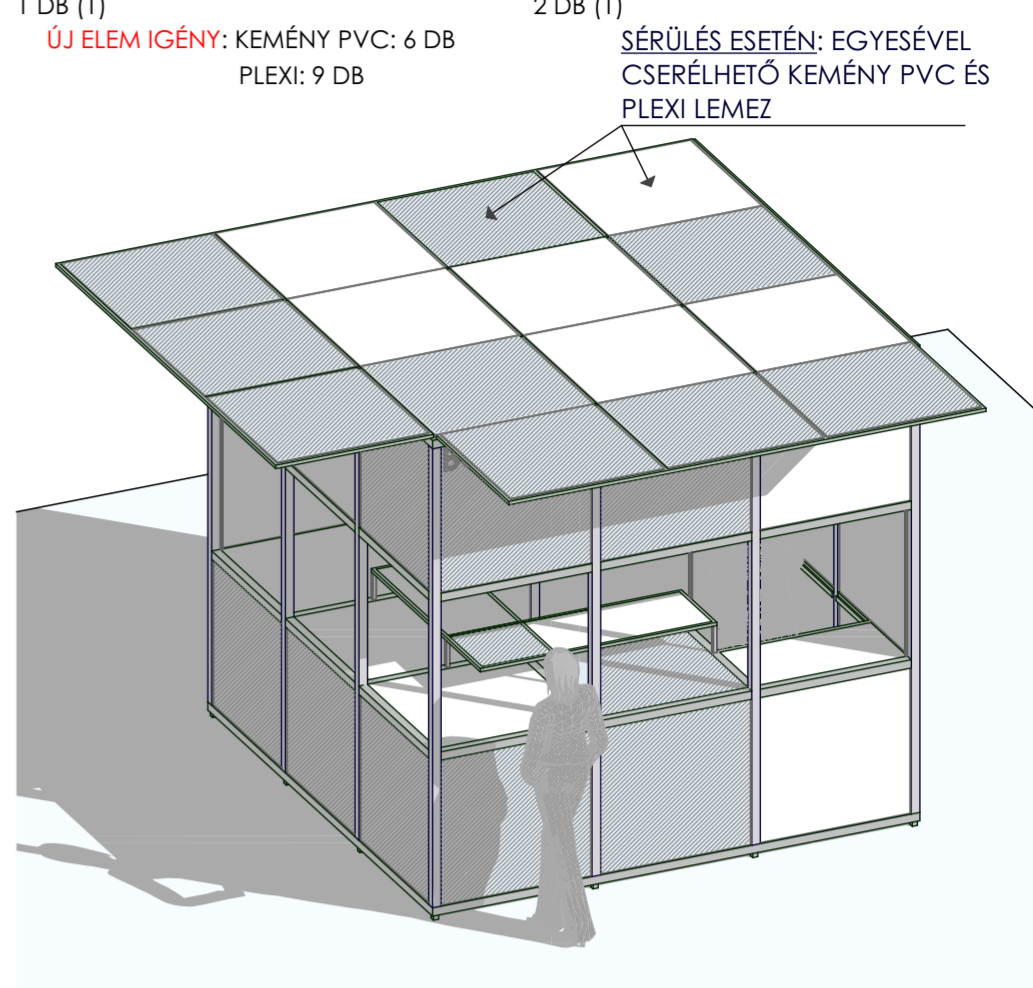


8. A KÉSZ BUDAPEST BOX - ZÁRÁSNÁL A HIÁNYZÓ LAPOK BEHELYEZENDŐEK

ELMETSZETT PAVILON

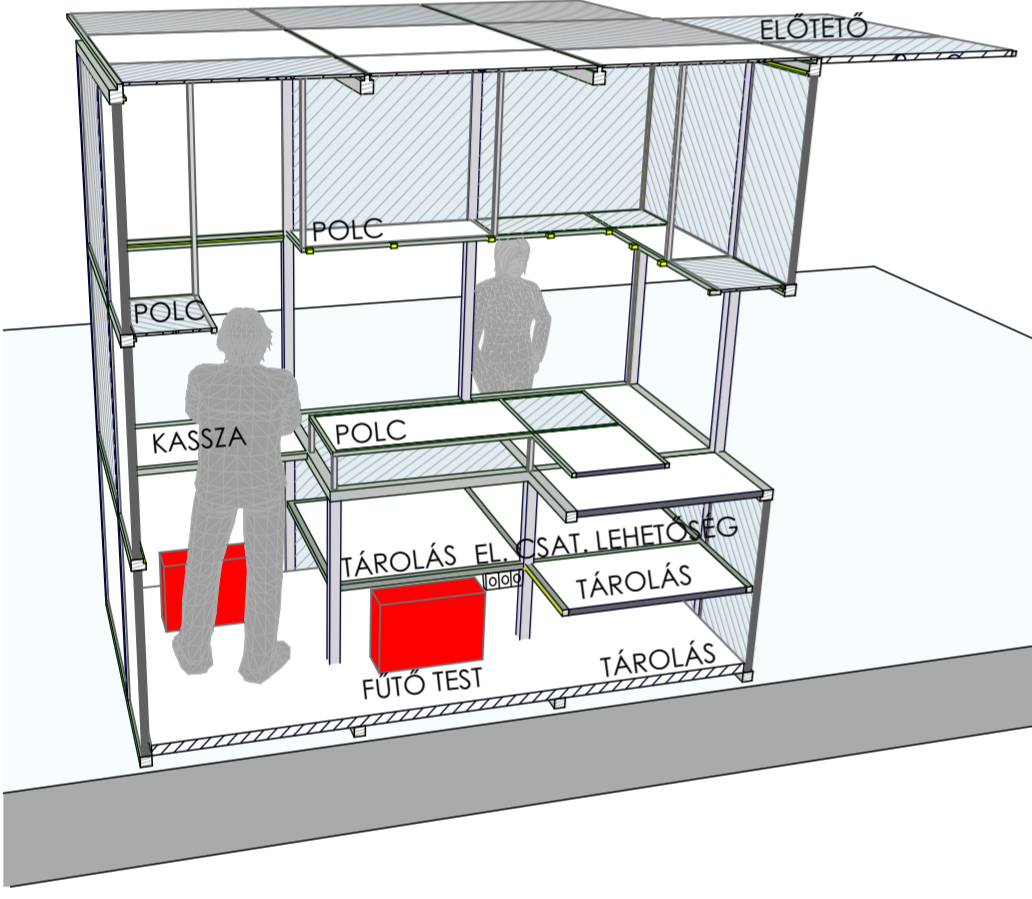

SZERKEZETI ELEMÉK

VÁZ ELEMÉK JELÖLÉSE: PL: (2-1-1)

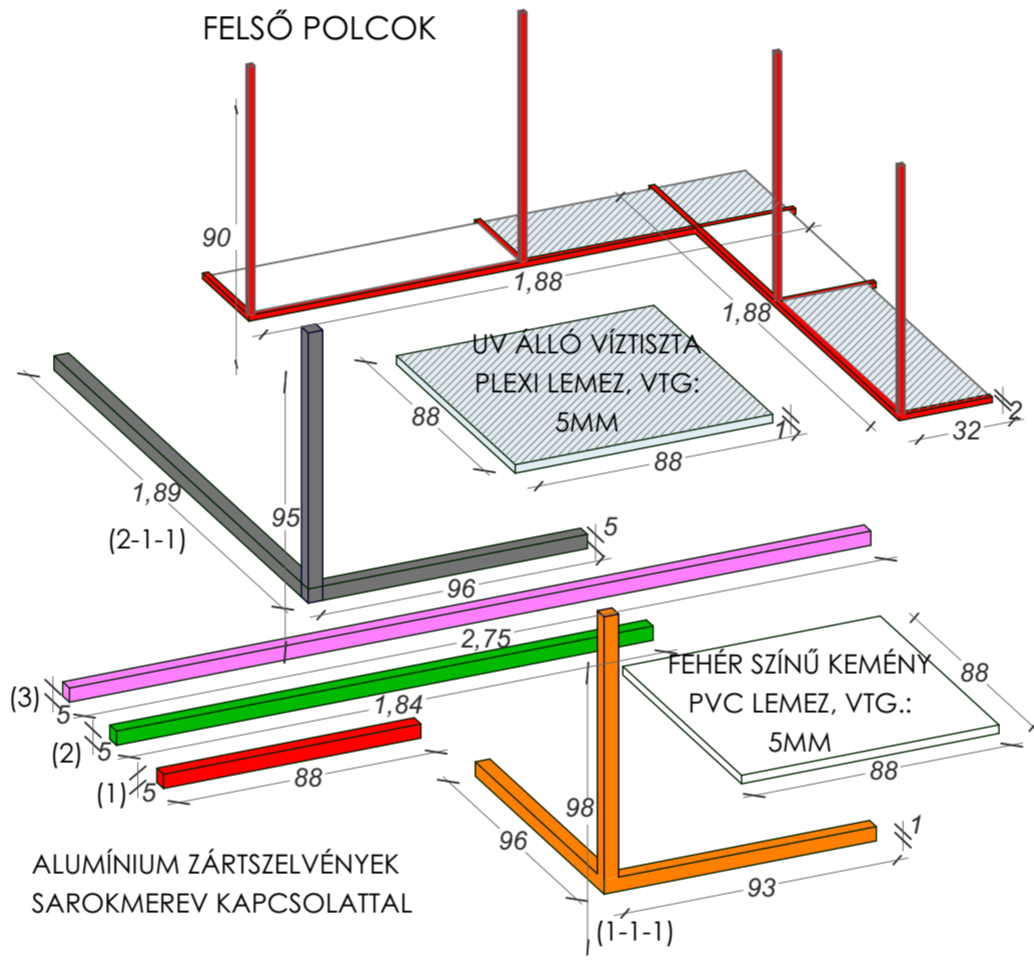

FELIRATOK: EGYEDI MEGRENDELÉS ESETÉN A PLEXI ÉS A PVC LAPOK ELÉ AKASZTOTT KIVITELBEN. A BETŰK VÉkony PLEXI LAPRA RAGASZTVÁ KÉSZÜLNÉNEK.

KÖLTSÉGBECSLÉS 1 DB BOXRA SZÁMOLVA

ÖSSZES ELEM MENNYISÉGE:
 VÁZSZERKEZET: (50x50 MM AL. ZÁRTSZELVÉNY)
 - 3 DB (1-1-1) 1DB/2,87 M - 8,61 M
 - 13 DB (2-1-1), 1DB/3,8 M - 49,4 M
 - 14 DB (1), 1DB/0,88 M - 12,32 M
 - 11 DB (2), 1 DB/1,84 M - 20,24 M
 - 8 DB (3), 1 DB/2,75 M - 22,00 M
 - ÖSSZESEN: 112,57 M

1 DB BOX ÁRA BECSÜLVE:
 VESZTESÉGI TÉNYEZŐ: 1.05
 A: 987.250 x 1,05 = 1.036.613 FT
 SZERELÉSI KÖLTSÉG + 10%
 EGYÉB RÖGZÍTŐ ELEMÉK, CSAVAROK, MEREVÍTŐK, TÖMÍTÉS BECSÜLT ÉRTÉKE A TELJES ÁR 15 %-A, AZAZ 1.036.613 FT X 1,25 = 1.295.766 KEREKÍTVE: **1,3 M FT**

LAP ELEMÉK:
 - KEMÉNY PVC: 29 DB, 1 DB/0,775M² - 22,475 M²
 - PLEXI: 31 DB, 1 DB/0,775M² - 24,025 M²
 - JÁRÓLAP: 9 DB, 1 DB/0,880 M² - 7,92 M² x 9,341 FT = 73,980 FT

FELSŐ POLC VÁZSZERKEZET: (20x20 MM AL. ZÁRTSZELVÉNY), (2DB)
 - ZÁRTSZELVÉNY ÖSSZ HOSSZA/POLC=(1,88+0,32+0,32+0,9+0,9)x2=8,64 M
 - 2 x 8,64 = 17,28 M



ELŐTETŐ VÁZSZERKEZET: (20x20 MM AL. ZÁRTSZELVÉNY), (2DB)
 - 2,79 x 2 + 1,86 x 4 + 0,92 = 13,94 M/ DB - 27,88 M

POLC + VÁZSZERKEZET + AJTÓ (5,42) + TÖBBI POLC (18,40) ÖSSZESEN: 68,98 M

ANYAGÁRAK:
 - PLEXI LEMEZ 5MM VTG-BAN: 15,365 FT/M² x 24,03 M² = 369,220 FT
 - KEMÉNY PVC LEMEZ: 4,883 FT/M² x 22,46 M² = 109,672 FT
 - ALUMÍNÍUM ZÁRTSZELVÉNY, 50X50 MM 6,0 M/SZÁL - 18,681 FT/DB - 3,113 FT/M x 112,57 M = 350,430 FT
 - ALUMÍNÍUM ZÁRTSZELVÉNY, 20X20 MM 6,0 M/SZÁL - 7,304 FT/DB - 1,217 FT/M x 68,98 M = 83,948 FT

(+) 987.250

RUGALMAS SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS

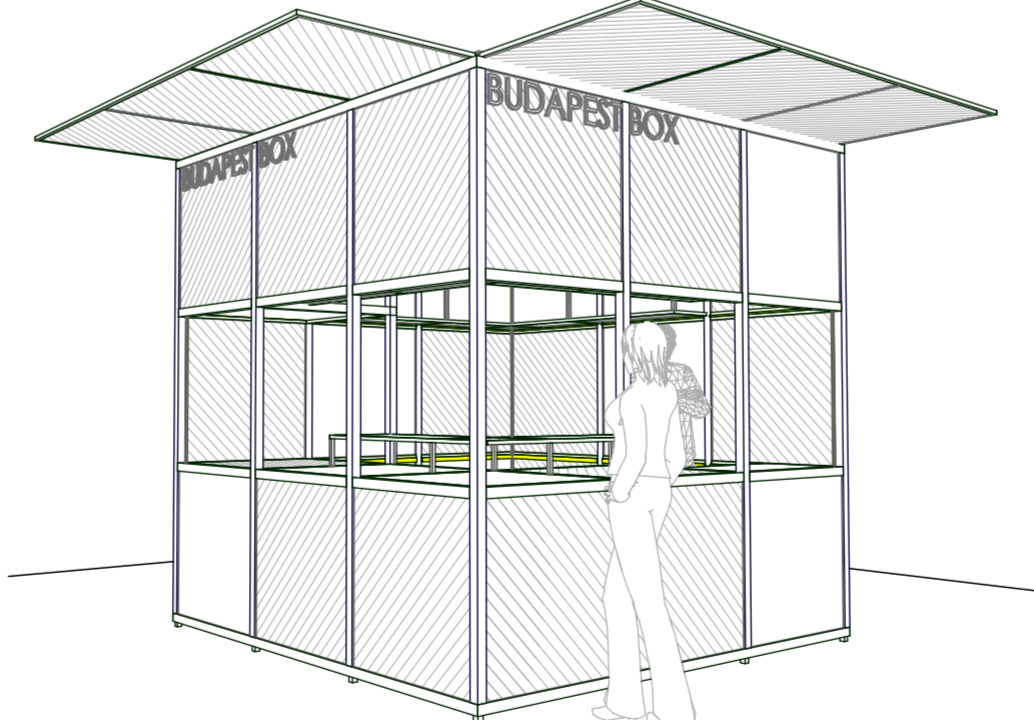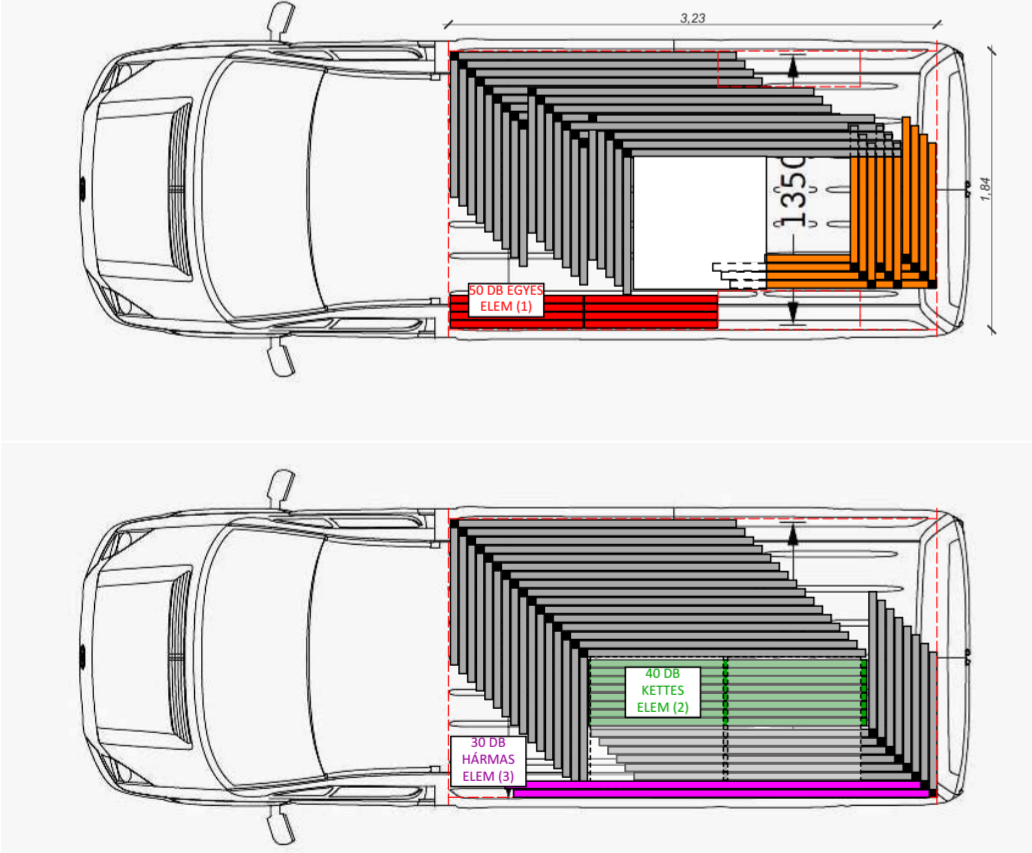

RAKTÁROZÁS: PVC ÉS PLEXI LAPOK, KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK: ELŐRE GYÁRTOTT MÉRETPONTOS DOBOZOKBAN. A VÁZSZERKEZET: SZAKADÁSMENTES SZÖVET FÓLIÁVAL ELVÁLASZTOTT A KARCOLÁSOK ELKERÜLÉSE VÉGÉTT.

MŰSZAKI LEÍRÁS

TARTÓSZERKEZET: A PAVILON KÖNNYŰ SZERKEZETES, ALUMÍNÍUM ZÁRTSZELVÉNY VÁZBÓL, ÉS A VÁZ KÖZÉ PATINTOTT- ILLESZTETT VÍZTISZTA PLEXI ILLETVE FEHÉR KEMÉNY PVC LAPOKBÓL ÉPÜL FEL. A ZÁRTSZELVÉNYEK KAPCSOLÓDÁSÁT REJTETT BELSŐ CSÓ VÁZ ÉS RUGÓS KLIPSZEKKEL LEHET EGYMÁSHOZ RÖGZÍTENI.

ANYAGOK: ELŐRE GYÁRTOTT, GYORSAN SZERELHETŐ, IDŐJÁRÁS ÁLLÓ ALUMÍNÍUM, KEMÉNY PVC ÉS VÍZTISZTA PLEXI KÉPEZI A FŐ ÖSSZETEVŐ ELEMÉKET. EZEN ANYAGOK ISMÉLTÖDNÉK - VARIÁLHATÓAK A BELSŐ TÉR - POLCOK KIALAKÍTÁSÁNÁL IS.




ESŐVÍZ ELVEZETÉS: A PAVILON TETEJE 3 DB HOSSZÚKÁS LAPBÓL ÁLL, MELYEK TÖMÍTŐ SZALAGGAL VANNAK EGYMÁSTÓL SZIGETELVE. LEJTÉSÜK A PAVILON HÁTSÓ HOMLOKZATA FELÉ, A BOX OLDALÁTÓL ELTARTOTT APRÓ VÍZVETŐVEL A FÖLDRE ÉRKEZIK A VÍZ, KÜLÖN ESŐGYŰJTŐ CSATORNA NEM SZÜKSÉGES.

ELEKTROMOS HÁLÓZAT: KÜLÖN KIALAKÍTÁSÚ VILLAMOS SZEKRENY LETT ELHELYEZVE A PADOZATRA ÜLTETVE, A VEZETÉKEK A PADOZAT ALJÁHOZ RÖGZÍTVE FUTNAK, ELEMELVE AZ ESŐVÍZTŐL. A VEZETÉKEK AZ AL. VÁZHOZ RÖGZÍTVE FUTNAK A KÍVÁNT HELYRE CSATLAKOZÁSI PONTOT KIALAKÍTVA.

BIZTONSÁG: BENTRŐL BEPATINTHATÓ KEMÉNY PVC ÉS PLEXI LEMEZEK, ZÁRÁS ELŐTT ELHELYEZENDŐEK, ILLETVE 3 PONTON ZÁRTHATÓ AJTÓ ÉS BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT.

FENNTARTHATÓSÁG, ÜZEMELTETHETŐSÉG: EGYESÉVEL CSERELHETŐ PVC ÉS PLEXI LEMEZEK, UTÁNGYÁRTHATÓ ZÁRTSZELVÉNYEK ÉS RÖGZÍTŐ ELEMÉK. 3-5 CM-RE A TALAJTÓL ELEMELT PAVILONOK - LÁSD. EL. HÁLÓZAT.

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK FELOSZTÁSA

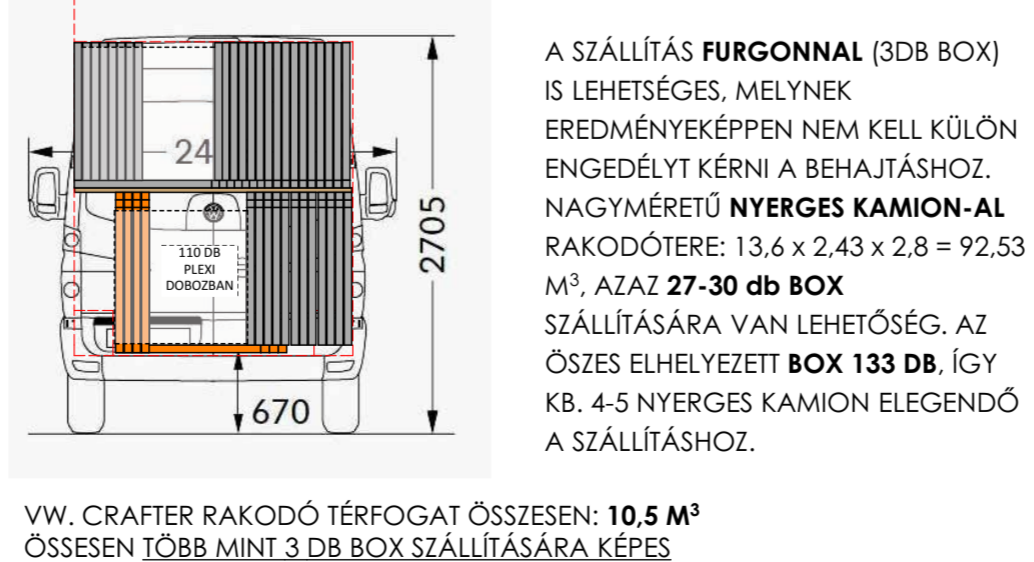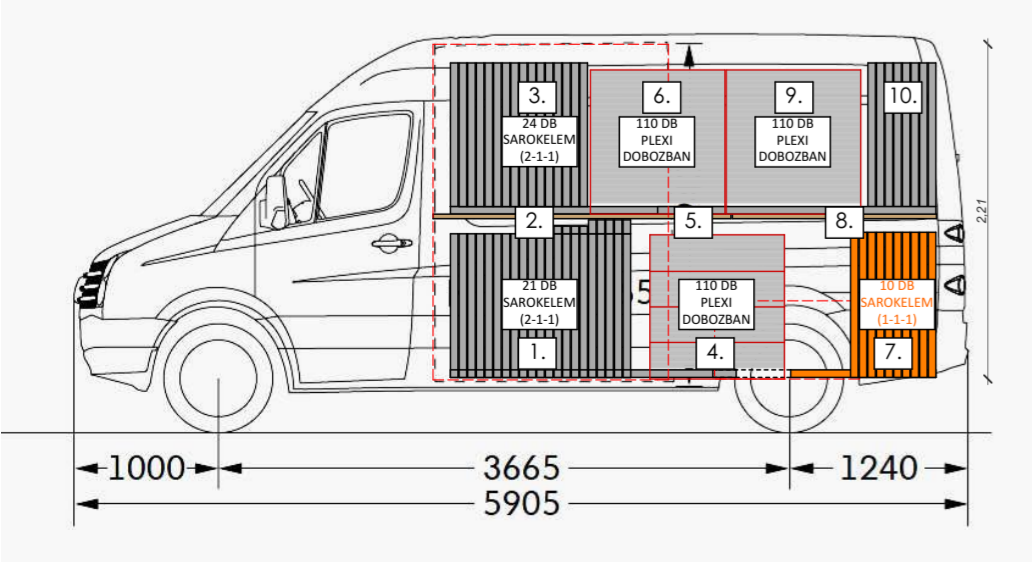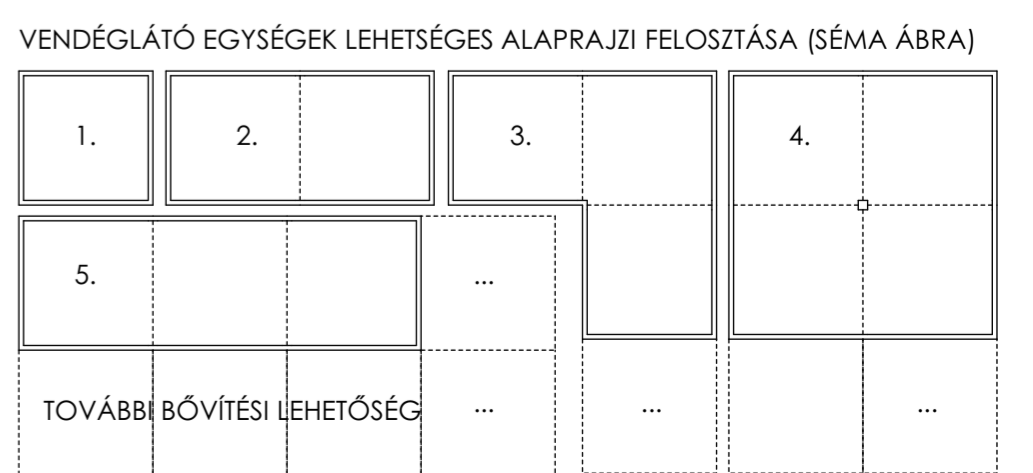

VW. CRAFTER RAKODÓ TÉRFOGAT ÖSSZESEN: 10,5 M³
 ÖSSZESEN TÖBB MINT 3 DB BOX SZÁLLÍTÁSÁRA KÉPES
 1-10- IG A RAKODÁSI LOGIKUS SORRENDJÉT JELÖLI (2-ES ELVÁLASZTÓ LAPOK)
